

太陽光発電設備竣工検査結果報告書

工事名 :

[REDACTED]

場所 :

[REDACTED]

工期 :

[REDACTED]
~
[REDACTED]

検査日 :

令和6年11月13日

工事会社 :

[REDACTED]

立会責任者 :

[REDACTED]

検 査 項 目 (目 次)

検査項目	検査・試験項目 詳細	ページ
—	機器設備一覧表	1
—	VE案採用仕様確認	2
1-1、全体・アクセス	清掃状況・アクセス・施工	3
1-2、機器外観検査	太陽光モジュール・架台・ケーブル	4
1-3、機器外観検査	交流集電箱	5
1-4、機器外観・動作検査	パワーコンディショナー	6
1-5、機器外観・動作検査	遠隔監視システム/検定メーター	7
1-6、機器外観・動作検査	自立コンセント	8
1-7、機器外観・動作検査	キュービクル	9
2-1、開放電圧測定	太陽光モジュール・アレイ系統開放電圧測定	10
2-2、運転電流測定	太陽光モジュール・アレイ系統運転電流測定	11
3-1、絶縁抵抗測定	太陽光モジュール・各系統絶縁抵抗測定	12

機器設備一覧表

	型式	メーカー	数量
太陽光モジュール	TSM-425DE09R	[REDACTED]	372枚
	(Pmax) 425 W		
	(Voc) 50.2 V		
キュービクル (太陽光用新設)			
ダウントランス			
パワーコンディショナー	EPG-T99P5	[REDACTED]	10台
遠隔監視システム	エッジシステム	[REDACTED]	1台
集電箱	N751216	[REDACTED]	1台
太陽光架台	ハゼ式折板アルミ金具	[REDACTED]	1式

VE案適用一覧表

No	検査内容	実施の有無	備考
	VE案採用仕様の場合は採用されているVE項目にチェックを入れる事		
①	屋上(屋根上)配管を採用する(ケーブルラックをエフレックス+スパイラルなどの変更する)	☒	一部ケーブルラック
②	ケーブルの結束材料の変更(耐候性インシュロックからバインド線などを使用して固定も可とする)	☒	
③	アレイ配線の屋根材接触に関する緩和(「屋根材接触NG」から「屋根材の山部分接触はOK」に変更)	☒	
備考・特記事項			

1-1. 現場全体（清掃状況、アクセスなど）、施工

発電所名		検査日
		2024/11/13
判定項目 現場の施工後の清掃状況および電気主任技術者が安全に保全活動ができるかどうかを確認する(アクセスなど)	検査会社名 検査者名	
	測定会社名 測定者名	

検査項目	検査内容	検査判定	備考
清掃状況	施工場所の清掃はできていたか	OK	
	施工中の材料の残りはなかったか	OK	
	盤内・屋根上等はきれいになっていたか(切粉の清掃など)	OK	
	既存設備に工事起因による錆が無い(キュービクル廻り、PCS廻りなど)	OK	
アクセス状況	盤面の保全アクセスは安全にできるか(上段PCSなど)	OK	
	☐ 常設の昇降設備 ☐ EPCが納入した脚立を利用		
	☐ 店舗の脚立を利用 ☐ 不必要 ☐ その他		
	太陽光パネルの保全アクセスは安全にできるか	OK	
	☐ 常設の昇降設備 ☐ EPCが納入した脚立を利用		
	☐ 店舗の脚立を利用 ☐ 不必要 ☐ その他		
	保全する場所がケーブルラックの場合は耐荷重トレイになっていたか(そのトレイに立たないとメンテが出来ない場所)	OK	埋設工事なし
	埋設工事箇所があったかどうか、確認する事。 (原則埋設工事はおこなっていないため)	OK	
その他	店舗外観写真を撮る	OK	

備考・特記事項

1-2. 機器外観検査 対象機器 太陽電池モジュール及び架台

発電所名			検査日	2024/11/13
判定基準 各機器を目視・納入仕様書・配置図にて検査し、異常が無いことを確認 太陽電池モジュール 型式：TSM-425DE09R メーカー：トリナソーラー 設置架台工法：ハゼ式折板アルミ金具 *メーカー仕様：Pmax 425 w/枚 Voc 50.2V/枚(±10%)	検査会社名 検査者名：			
	測定会社名 測定者名：			
検査項目	検査内容	検査判定	備考	
モジュール	異常が無いこと（損傷、汚れ、ぐらつき）	OK		
	図面通りのモジュールを使用していること (必要に応じて反射光対応パネルや塩害対策対応品となっているか)	OK		
	モジュール配置および枚数が図面通りであること (影の影響がないこと)	OK		
	パネル間の接地が適切であること	OK		
	太陽光パネルの誤った箇所にアースを取っていないか確認する 事（メーカーの保証がなくなる可能性があるため） (指定箇所がある場合は指定箇所からアースを取ること)	OK		
	塩害仕様の場合、適応した部材を使用しているか 金物など(海岸より500m)	—		
	積雪仕様の場合、適応した部材を使用しているか	—		
回路構成確認	直列台数が図面通りであること*別紙開放電圧にて確認	OK		
	並列回路数が図面通りであること	OK		
取付状況	取付ボルト、ナットの締め締め付けマーキングがあること 金具締め付けトルクがメーカーマニュアル通りであること (仕様書を実際に書面若しくは目視で確認する+抜き取りでトルク値確認)	OK	上限値 (13) N.m/下限値 (11) N.m 施工時の設定トルク値 (13) N.m	
	※全体をまんべんなくランダムに20箇所程度 モジュール間（中間部）&端部を、それぞれ10箇所ずつ トルク下限値に設定して、しっかり締まっているか確認を行う	OK		
ケーブルトレイ	ケーブルトレイのルートが図面と違う箇所はあったか確認する 事。また、屋根面の汚れがひどい箇所を避けていれば記載する 事(油分がある排気ダクトの近傍など)	OK		
	ケーブルトレイの支持は2m以下になっていたか	OK		
	ケーブルトレイのカバー固定金具は50cmに毎に設置されている か	OK		
	ケーブルトレイの垂直部・傾斜部・水平部・R部の設置方法は適切か (垂直部のカバーはボルトタイプになっているか)	OK		
	エンドカバーの仕舞は適切か	OK		
ケーブル	埋設はFEP管、露出部分はPFD管を使用していること	OK		
	波りのケーブルは直射日光に当たらないように2重管などの保護 を施しているか	OK		

1-3. 機器外観検査 集電箱

発電所名		検査日	
		2024/11/13	
判定基準 各機器を目視・納入仕様書・配置図にて検査し、異常が無いことを確認する。		検査会社名 検査者名:	
型式: N751216 メーカー: 仕様:		測定会社名 測定者名:	
設置場所・台数	設置場所が図面通りであること	OK	
	集電箱へのメンテアクセスに問題はないか	OK	
	外観および取付に異常が無いこと(損傷、汚れ、ぐらつき)	OK	
	台数は図面通りであるか	OK	
	外壁等に部材を取り付ける際の防水処理確認	OK	
	基礎部はしっかりと設置しているか、ゴム板はあるか	OK	
盤内取付状態	目視確認で異常が無いこと(損傷、汚れ、さびなど)	OK	
	接続図通りであること	OK	
	箱内機器等の取付状態(揺れ、緩みがないこと)	OK	
	接地が適切であること	OK	
結線状態	誤接続、端子に緩みがないか目視確認すること	OK	
	整線状況、線名札取り付け、防水絶縁パテ状況等の確認	OK	
	ケーブルの行き先表示タグの有無	OK	
引き渡し図書保管	単線結線図、電力会社の回答書、レイアウト、停電時復帰マニュアル、PCS取説、自立運転操作マニュアル、および自主検査表が保管されているか?	OK	
動作試験	通電時に異音、異臭、異振がないこと	OK	
	保護装置試験を実施したことを自主検査表で確認する	OK	
動作電流測定(交流)	電技基準値と比較※5台中1台以上チェック工事会社の自主検査にて事前確認を実施してもらい、結果を確認。	OK	
電圧測定(交流)	電技基準値と比較※5台中1台以上チェック工事会社の自主検査にて事前確認を実施してもらい、結果を確認。	OK	

1-4. 機器外観・動作検査 パワーコンディショナー

発電所名	株	検査日	
		2024/11/13	
判定基準 各機器を目視・納入仕様書・配置図にて検査し、異常が無いことを確認する。 型式: EPG-T99P5 メーカー: 出力方式: 三相3線式 出力: 9.9kw 台数: 10台 型式: メーカー: 出力方式: 出力: 台数:		検査会社名: 検査者名: 測定会社名: 測定者名:	
設置場所・台数	設置場所が図面通りであるか	OK	
	PCSへのメンテアクセスに問題はないか(上部設置されている場合のアクセス方法を確認する)	OK	
	ケーブルトレイの上に立ってメンテナンスが必要な場合は耐荷重トレイとなっているか	—	
	台数は図面通りであるか	OK	
	PCS盤間に必要な間隔がとられているか (PCSは500mm)	OK	
	庇(日よけ)は設置されているか、設置の向きを確認する。直射日光が当たらないように設置真東～北～真西向きに設置されていればOK	OK	
	外壁等に部材を取り付ける際の防水処理確認	OK	
	基礎部はしっかりと設置しているか、ゴム板はあるか	OK	
	支持材にしっかりと固定されているか(ボルト) PCS、支持材を握って数回揺すって確認する	OK	
	パワコンのPF管 立下り部において水抜き加工を実施しているか否かを確認する(EPCへの聞き取り)	OK	
PCS単体	外観の目視確認で異常が無いこと(損傷、汚れ、ぐらつき、錆、塩害など)	OK	
	接続図通りであること	OK	
	取付状態及び配線状態に異常が無いこと	OK	
	接地が適切であること	OK	
	末端のパテ状況、レベル状況確認等	OK	
結線状態	誤接続、端子に緩みがないか目視確認すること	OK	
	整線状況、線名札取り付け、防水絶縁パテ状況等の確認	OK	
	ケーブルの行き先表示タグの有無	OK	

1-5. 機器外観・動作検査 遠隔監視システム/検定メーター

発電所名		検査日	
判定基準 各機器を目視・納入仕様書・配置図にて検査し、異常が無いことを確認する。		2024/11/13	
型式: エッジシステム メーカー:		検査会社名	
台数: 1 台		検査者名: 大	
		測定会社名	
		測定者名: 磯	
設置場所・台数	設置場所が図面通りであるか メンテアクセスに問題はないか(上部設置されている場合のアクセス方法を確認する) ケーブルトレイの上に立ってメンテナンスが必要な場合は耐荷重トレイとなっているか 台数は図面通りであるか 外壁等に部材を取り付ける際の防水処理確認 基礎部はしっかりと設置しているか、ゴム板はあるか	OK OK OK OK OK OK	
制御盤単体 盤内	外観の目視確認で異常が無いこと(損傷、汚れ、ぐらつき、錆、塩害など) 接続図通りであること 取付状態及び配線状態に異常が無いこと 接地が適切であること	OK OK OK OK	
結線状態	誤接続、緩みがないか目視確認すること 結線端子に緩みがないこと、浮きがないこと 整線状況、線名札取り付け、防水絶縁パテ状況等の確認 ケーブルの行き先表示タグの有無	OK OK OK OK	
USB (フィールドロジックの場合)	コントロールパネル内にあるFiled LogicのUSBはBack Up Data取得のため、筐体に挿しているか、確認する事		
試験端子	CT, VT, ZPDの試験端子が設置されているかどうか確認する事(遠隔制御盤内に設置の場合)	—	
検定メーター	製造番号・初期値・有効期限・設置環境・有効期限の4つ撮影(連系日に撮影) 盤にメーターの初期値と連系日を記入シテプラ等を貼ってあることを確認する	OK OK	乗率の数値記載間違い
Eメーター	Eメーターの設置を確認する(施設側の電力系) ※系統購入電力量&余剰電力量を計測	OK	
整定値	整定値を確認し、回答書と同じであったか	OK	
動作試験	通電時に異音、異臭、異振がないこと	OK	
(通信確認) ※フィールドロジックの場合	突発電量と遠隔装置表示値に差異が無いこと (フィールドロジック機器上の発電量を記録し、その時間を記録する事)		()kW (時 分)
	連系時計測データの整合性確認 現地に保管してあるQRコードからスマホ疎通画面へアクセスし、通信状態の確認を行う。 ・通信状態の確認 各機器がオールグリーン状態になっているか確認。 ※「コアデバイス」はグリーンにならないのでそれ以外がグリーンである事を確認すること スクリーンショットで写真を残すこと。 連系時計測データの整合性確認	OK	
			[PCSにおける発電量]

1-6. 機器外観・動作検査 自立コンセント

発電所名			検査日	
			2024/11/13	
判定基準 各機器を目視・納入仕様書・配置図にて検査し、異常が無いことを確認する。			検査会社名 検査者名	
格納BOX 型式: メーカー: 露出コンセント			測定会社名 測定者名	
設置場所・台数	地上から使用できる施設外壁に設置されているか	OK		
	ELB付自立コンセント(100V)が3台(1500W/台)設置されているか	OK	1台	
外観点検	目視確認で異常が無いこと(損傷、汚れ、ぐらつきなど)	OK		
	外壁等に部材を取り付ける際の防水処理確認	OK		
	基礎部はしっかりと設置しているか、ゴム板はあるか	OK		
	挿しこみ口がFLより1800mm以下であること	OK		
単体機器	IPX3以上の防水ボックスに収納されていること(工事会社に確認)※雨の影響を受けない事	OK		
	箱内機器等の取付状態及び配線状態に異常が無いこと	OK		
	末端のパテ状況、レベル状況、水抜き穴等	OK		
動作試験	自立運転が行えること	OK		
その他	コードリール50m3台を店舗側に引き渡したか	—		
	自立運転マニュアルと共に店舗側に説明したか	OK		
	PCSと集電盤の鍵を店舗側に渡したか (鍵のそれぞれが判る「札」が付いている事)	OK		

備考・特記事項

1-7. 機器外観・動作検査 既設キュービクル(建物側)

発電所名		検査日	
		2024/11/13	
判定基準 各機器を目視・納入仕様書・配置図にて検査し、異常が無いことを確認する。		検査会社名	
		検査者名	
型式:		測定会社名	
メーカー:		測定者名	
周囲清掃状況	キュービクル周りの清掃状況はきれいか(錆の発生はないか、工事残置物はないか)	OK	
アクセス	主要な動線上や保全する場所のケーブルラックは耐荷重トレイになっていたか(踏まないと通れない通路、そのトレイに立たないとメンテが出来ない場所)	OK	
新規埋設工事	埋設工事箇所があったかどうか、確認し、あれば記録する事(原則埋設工事はおこなっていないため)	OK	埋設工事なし
キュービクル内 電気設備取付状態	目視確認 電気設備が単結通りに取り付けられているか	OK	
	取付状態に揺れ、緩みがないこと	OK	
	盤内の施工した箇所及びその直下はきれいになっていたか(切粉の清掃など)	OK	
	OVGR,ZPD,RPRの設置を確認したか	OK	
	CT,VT,ZPDの試験端子はあるか(キュービクル内設置の場合)	OK	
	接続用の主幹ブレーカーがELBであるか確認する事 MCCBIになっているケースが見られる場合がある	OK	
	ELBのAF/ATが図面通りか確認する事 パワコンの定格出力電流値xパワコン台数に対してATが十分であるか確認する(1.3倍程度が目安) 図面と現地の設置状況を確認する。	OK	
	幹線パワーケーブルのサイズが図面通りであるか確認する 余剰売電使用の場合、電力会社所有の電力メーターの設置を確認する。(これが設置されていないと連系不可となる)	—	
整定値確認	整定値を確認し、回答書と同じであったか(RPR,OVGR)	OK	
結線状態	目視確認 誤接続、緩みがないこと	OK	
	整線状況、線名札取り付け、防水絶縁パテ状況等の確認	OK	
	太陽光用ブレーカーのデブラ / ケーブルの行き先表示タグの有無	OK	
	接地は適切に接続されているか	OK	
測定	連系前:太陽光設備接続前の漏れ電流を測定する(大元で測る)	OK	(40)mA 3台のみ運転

発電所名							
測定日	2024/11/13		天候	晴	測定時刻	10:30	
検査者			測定者				

太陽電池モジュール	型式:	TSM-425DE09R			メーカー:	
メーカー仕様	P _{max}	425w	/枚	V _{oc}	50.2V	/枚(± 10 %)

直列数を考慮した上で、各ストリングを比較(1クラスター以上の電圧差や異常が無いことを確認する事)

※パネルメーカー毎のクラスター数を確認すること

[illegible]

2-2. ア

発電所名					
測定日	2024/11/13	天候	晴	測定時刻	10:30
検査者		測定者			

判定基準(20%抜き取り検査)
太陽電池モジュール 型式: TSM-425DE09R メーカー: XXXXXXXXXX
メーカー仕様 Pmax 425w /枚
各ストリングの運転電流をクランプメータで測定し、バラツキがないことを確認

[illegible]

発電所名					
測定日	2024/11/13	天候	晴	測定時間	10:30
検査者		測定者			

判定基準 各系統の対地間の絶縁抵抗値を絶縁抵抗計で測定し、抵抗値が0.4MΩ以上とする。(20%抜き取り検査)
* 絶縁測定レンジはDC500Vとする。

[illegible]

3-2. 絶縁抵抗測定

発電所名					
測定日	2024/11/13	天候	晴	測定時刻	10:30
検査者		測定者		磯	

判定基準
交流集電箱から各パワーコンディショナ間のケーブルの対地間絶縁抵抗値を絶縁抵抗計で測定する。 * 絶縁測定レンジはDC500Vとし、抵抗値が0.4MΩ以上とする。(20%抜き取り検査)

パワーコンディショナ No.	相	判定基準値	測定値	判定結果	備考
1	R-N	0.4MΩ以上	100MΩ以上	OK	
	S-N	0.4MΩ以上	100MΩ以上	OK	
	T-N	0.4MΩ以上	100MΩ以上	OK	
2	R-N	0.4MΩ以上	100MΩ以上	OK	
	S-N	0.4MΩ以上	100MΩ以上	OK	
	T-N	0.4MΩ以上	100MΩ以上	OK	

4-1. 接地抵抗測定

発電所名				
測定日	2024/11/13	天候	晴	測定時間
検査者		測定者		

判定基準	
A種接地工事	10Ω 以下
B種接地工事	変圧器の高圧側又は特別高圧側電路の一線地絡電流のアンペア数で150(中略)を除いた値に等しいΩ数以下。但し、5Ω未満であることを要しない。
C種接地工事	10Ω 以下
※1	(低圧電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.2秒以下の漏電遮断器を施設するときは500Ω以下とする)
D種接地工事	100Ω 以下
※2	(低圧電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.2秒以下の漏電遮断器を施設するときは500Ω以下とする)

測定箇所	接地種別	測定値(Ω)	法定値	判定	備考
太陽光架台	C種		10Ω 以下		
PCS	C種		10Ω 以下		
集電箱	D種		100Ω 以下		
キュービクル	A,B種		10Ω 以下		


接地方式：	統合接地でキュービクル内の接地に接続
-------	--------------------

適用・特記事項


5-1. チェック表

確認大項目	確認小項目	チェック内容・備考	確認
設置状況 (目視)	・図面との照合	モジュール枚数・レイアウト、PCS台数等確認	☒
	・単結との照合	単結とキュービクル壁内の機器構成、ブレーカーの数、PCS台数等の確認	☒
	・金具設置状況	抜粋でトルクチェック、傷・錆の確認を含む美観確認	☒
	・モジュール設置状況	抜粋でトルクチェック、影の影響の確認、傷の確認を含む美観確認等	☒
	・各機器設置状況(外観)	抜粋でトルクチェック、傷・錆の確認、直射日光の確認、レベル状況確認等	☒
	・各機器設置状況(内観)	盤線状況、線名札取り付け、防水絶縁パテ状況等の確認	☒
	・ラック設置状況	カバークランプ等の設置状況、エンドカバー設置状況等	☒
	・配管類設置状況	末端のパテ状況、レベル状況確認等	☒
	・盤線状況	折半屋根部確認 ※折半屋根に直接接触していないか	☒
	・防水処理確認	外壁等に部材を取り付ける際の防水処理確認	☒
	・自主検査表確認	現地で自主検査結果を確認すること	☒
	・日時計の設置環境	一日中日陰にならない	☒
	・気温計の設置環境	一日中日射が当たらない	☒
	・検定付きメーター	製造番号・初期値・有効期限・設置環境・有効期限の4つ撮影(連系日に撮影)	☒
	・連系開始時のメーター初期値	壁にメーターの初期値と連系日を記入シテプラ等を貼る	☒
電気関係 (測定)	・疎通確認	連系時計測データの整合性確認。通信状態の確認。	☒
	・開放電圧測定(直流)	メーカー基準値と比較※5台中1台以上チェック	☒
	・電圧測定(交流)	電圧基準値と比較※5台中1台以上チェック工事会社の自主検査にて事前確認を実施してもらい、結果を確認。	☒
	・正相測定	工事会社の自主検査にて事前確認を実施してもらい、結果を確認。	☒
	・絶縁抵抗測定	各機器間ケーブルのメガー測定	☒
	・漏れ電流測定	B種接地 (※既設側)	☒
	・警定値確認	各PCS、結電器 ※電力会社指示値の確認(全台チェック)	☒
	・漏れ電流測定	漏れ電流の計測はA種に統合されている場合は、計測しその値を記録する事。また、太陽光用ブレーカーが接続しているトランスにLGRが設置されている場合、LGRと同じ計測箇所で発電所設置前の漏れ電流を計測する事。	☒
	・自主検査表	壁内に保管	☒
	・単線結線図	壁内に保管	☒
	・電力会社の回答書	壁内に保管	☒
	・レイアウト	壁内に保管	☒
	・停電時復帰マニュアル	壁内に保管	☒
	・PCS取説	壁内に保管	☒
	・自立運転操作マニュアル	壁内に保管(お客様もお渡し)	☒
	・コードリール	お客様へ3台お渡し(その際にお客様へ自立運転操作の説明をしているか)	☐
	・鍵	PCSと集電盤の鍵を店舗側に渡したか (鍵のそれぞれが「札」が付いている事)	☒

6-1. 配置図

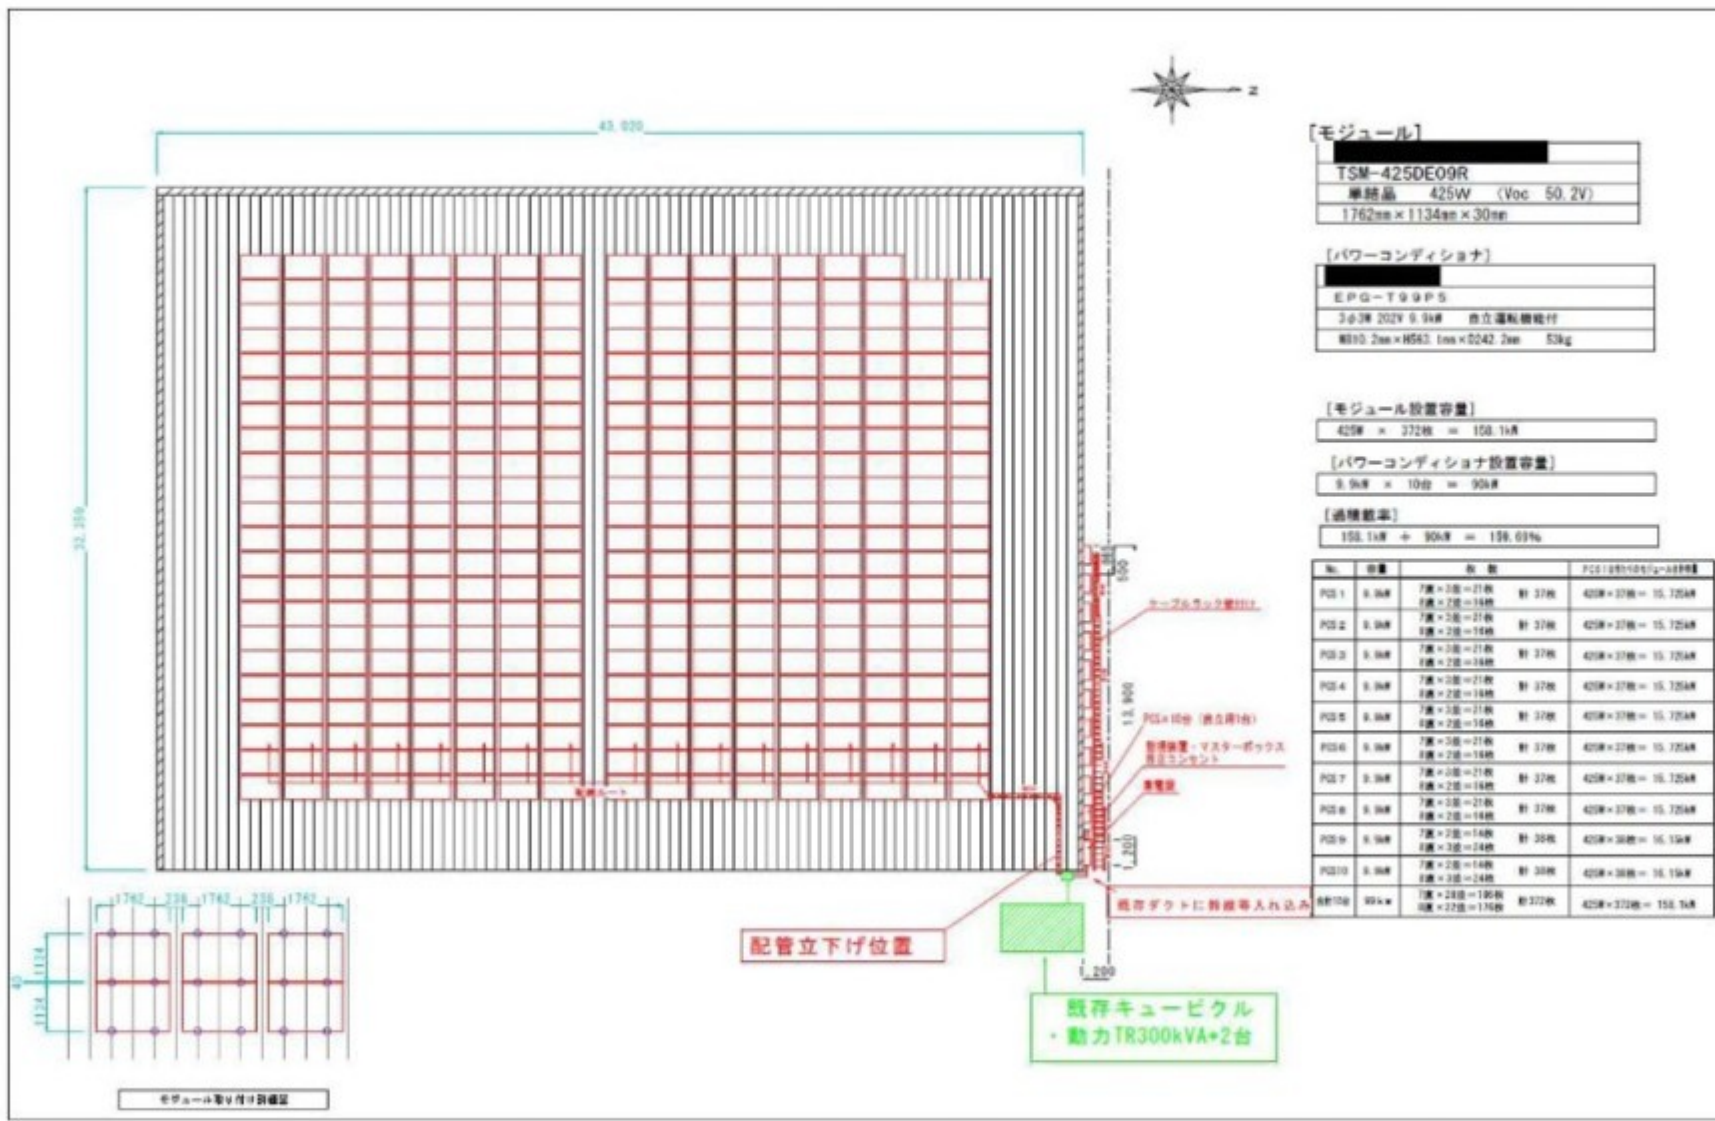

6-2. 單線結線圖

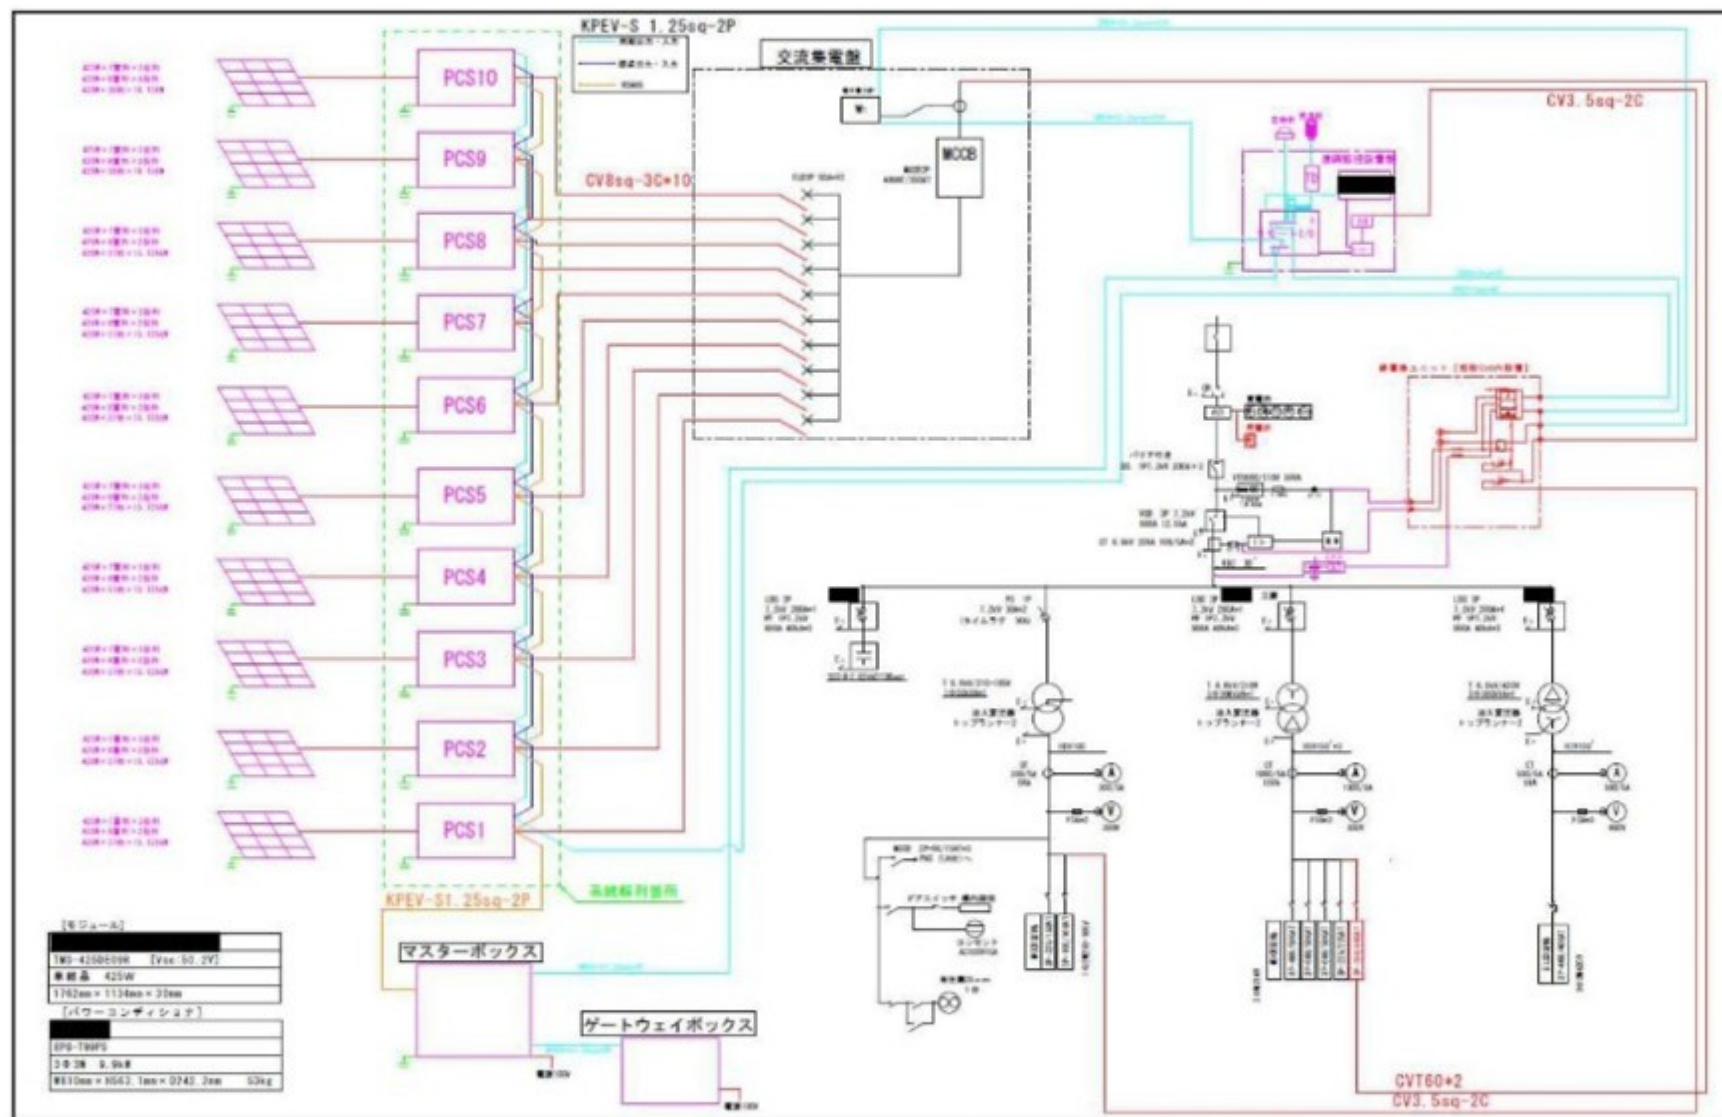

7-1. 検査写真

	店舗正面
	店舗名
	

	①検定メーター(全体写真) /(1台目)

	②検定メーター(メーター初期値) /(1台目)
---	-------------------------

7-1. 検査写真

	③検定メーター(有効期限) /(1台目)
	有効期限: 2031年8月

	④検定メーター(製造番号) /(1台目)
	製造番号: 278221
	検定番号: 東 16163

7-1. 検査写真



Eメーター

パルス検出器 (Eメーターの無い場合)


電力会社所有メーター(全副産電田メーター)

7-1. 検査写真

	QRコード確認画面 (エッジシステムの場合)
---	--

企業 [REDACTED] サイト [REDACTED] 作業開始予定 2024-11-13 10:11:35 作業終了予定 2024-11-13 11:03:00 実際の作業開始 2024-11-13 10:11:35 <table border="1"> <thead> <tr> <th>通信状態</th> <th>機種名</th> <th>アドレス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>eMeters</td> <td>192.168.0.1</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>MBX05_01</td> <td>192.168.0.1</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>sensors</td> <td>192.168.0.1</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>S2MS三相_01</td> <td>192.168.0.1</td> </tr> </tbody> </table>	通信状態	機種名	アドレス	●	eMeters	192.168.0.1	●	MBX05_01	192.168.0.1	●	sensors	192.168.0.1	●	S2MS三相_01	192.168.0.1	QRコード確認画面 (エッジシステムの場合)
通信状態	機種名	アドレス														
●	eMeters	192.168.0.1														
●	MBX05_01	192.168.0.1														
●	sensors	192.168.0.1														
●	S2MS三相_01	192.168.0.1														

企業 [REDACTED]	QRコード確認画面 (エッジシステムの場合)
---	------------------------

	QRコード確認画面(エッジシステムの場合)

ORコード確認画面 (ウェブシステムの場合)

7-1. 検査写真

	モジュールへのアクセス状況 <table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>							

	パネル設置外観 <table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>							

	トルク計測状況
---	----------------

7-1. 検査写真

	ケーブルラック設置状況

	ケーブルラック設置状況

	パネル下整線状況
--	----------

7-1. 検査写真



パネル下整線状況



日射計測設置状況

気温計取付状況

7-1. 検査写真



集電箱設置状況



集電箱内部

7-1. 検査写真

	PCS取付状況、ひよけ状況

	PCS取付状況

	PCS内部状況
--	---------

7-1. 検査写真

	取付金物類防水処理状況 ① 引きの写真

	取付金物類防水処理状況 ② UPの写真

	取付金物類防水処理状況 ③ 更にUPの写真
--	-----------------------

7-1. 検査写真

	マスターボックス、制御盤取付状況 <table><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>							

	マスターボックス、制御盤取付状況

7-1. 検査写真

	自立コンセント取付状況

	自立コンセント取付状況

7-1. 検査写真



キュービクル盤外観




接続用ブレーカー

連系ELB(キュービクル内のブレーカー)

7-1. 検査写真

	接地線接続状況(単独/統合)

8-1. 指摘事項一覧および写真

指摘事項①	
指摘内容	乗率の記載間違い 1→10に変更を依頼しました

是正前()



是正後()



指摘事項②	
指摘内容	

是正前()




是正後()



指摘事項③	
指摘内容	

是正前()



是正後()

